ID	Nome attività	Naturali e consecutivi	Durata
1	**INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL VIADOTTO CORZANELLO**	**353 g**	**253 g**
2	**INTERFERENZE CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE**		**211 g**
3	**Riduzione carr. DX (Sud) con chiusura corsia di marcia per utilizzo by-bridge - lavorazioni SOLO NOTTURNE**		**210 g**
4	FASE 1		3 g
5	FASE 2		5 g
6	FASE 3		5 g
7	FASE 4		5 g
8	FASE 5		3 g
9	**Riduzione carr. SX (Nord) con chiusura corsia di marcia per utilizzo by-bridge - lavorazioni SOLO NOTTURNE**		**209 g**
10	FASE 1		3 g
11	FASE 2		5 g
12	FASE 3		5 g
13	FASE 4		5 g
14	FASE 5		3 g
15	**NOLI**		**220 g**
16	**Ponteggi multidirezionali da terra su pile e spalle e sospesi su archi**		**220 g**
17	FASE 1		47 g
18	FASE 2		43 g
19	FASE 3		43 g
20	FASE 4		38 g
21	FASE 5		35 g
22	**Piattaforma By-Bridge per montaggio e smontaggio dei ponteggi su archi**		**211 g**
23	FASE 1		6 g
24	FASE 2		10 g
25	FASE 3		10 g
26	FASE 4		10 g
27	FASE 5		6 g
28	**INTERVENTI**		**253 g**
29	Attività propedeutiche (sopralluoghi, sistemazione viabilità esistente a piste di cantiere…)		10 g
30	Rimozione vegetazione per allestimento aree di cantiere		5 g
31	**INTERVENTI DI FASE 1**		**53 g**
32	Baraccamenti e delimitazione area operativa		4 g
33	Montaggio ponteggi		10 g
34	Ripristino spalle (INTERVENTO A)		12 g
35	Ripristino elevazioni pile (INTERVENTO B)		14 g
36	Ripristino archi (INTERVENTO C)		12 g
37	Ripristino solette di intervia (INTERVENTO D)		6 g
38	Adeguameto sistema smaltimento acque (INTERVENTO E)		2 g
39	Rimozione passerelle e realizzazione nuova accessibilità per ispezione vani interni agli archi (INTERVENTO F)		15 g
40	Smontaggio ponteggi		5 g
41	Smobilizzo del cantiere		2 g
42	**INTERVENTI DI FASE 2**		**49 g**
43	Baraccamenti e delimitazione area operativa		4 g
44	Montaggio ponteggi		9 g
45	Ripristino elevazioni pile (INTERVENTO B)		10 g
46	Ripristino archi (INTERVENTO C)		12 g
47	Ripristino solette di intervia (INTERVENTO D)		6 g
48	Adeguameto sistema smaltimento acque (INTERVENTO E)		2 g
49	Rimozione passerelle e realizzazione nuova accessibilità per ispezione vani interni agli archi (INTERVENTO F)		25 g
50	Smontaggio ponteggi		6 g
51	Smobilizzo del cantiere		2 g
52	**INTERVENTI DI FASE 3**		**49 g**
53	Baraccamenti e delimitazione area operativa		6 g
54	Montaggio ponteggi		9 g
55	Ripristino elevazioni pile (INTERVENTO B)		10 g
56	Ripristino archi (INTERVENTO C)		12 g
57	Ripristino solette di intervia (INTERVENTO D)		6 g
58	Adeguameto sistema smaltimento acque (INTERVENTO E)		2 g
59	Rimozione passerelle e realizzazione nuova accessibilità per ispezione vani interni agli archi (INTERVENTO F)		25 g
60	Smontaggio ponteggi		6 g
61	**INTERVENTI DI FASE 4**		**38 g**
62	Montaggio ponteggi		9 g
63	Ripristino elevazioni pile (INTERVENTO B)		10 g
64	Ripristino archi (INTERVENTO C)		12 g
65	Ripristino solette di intervia (INTERVENTO D)		6 g
66	Adeguameto sistema smaltimento acque (INTERVENTO E)		2 g
67	Rimozione passerelle e realizzazione nuova accessibilità per ispezione vani interni agli archi (INTERVENTO F)		15 g
68	Smontaggio ponteggi		6 g
69	**INTERVENTI DI FASE 5**		**39 g**
70	Montaggio ponteggi		10 g
71	Ripristino spalle (INTERVENTO A)		12 g
72	Ripristino elevazioni pile (INTERVENTO B)		7 g
73	Ripristino archi (INTERVENTO C)		12 g
74	Ripristino solette di intervia (INTERVENTO D)		6 g
75	Adeguameto sistema smaltimento acque (INTERVENTO E)		2 g
76	Smontaggio ponteggi		5 g
77	Smobilizzo del cantiere		4 g
78	Ripristino aree pre-intervento (rimozione piste, ripiantumazione...)		10 g

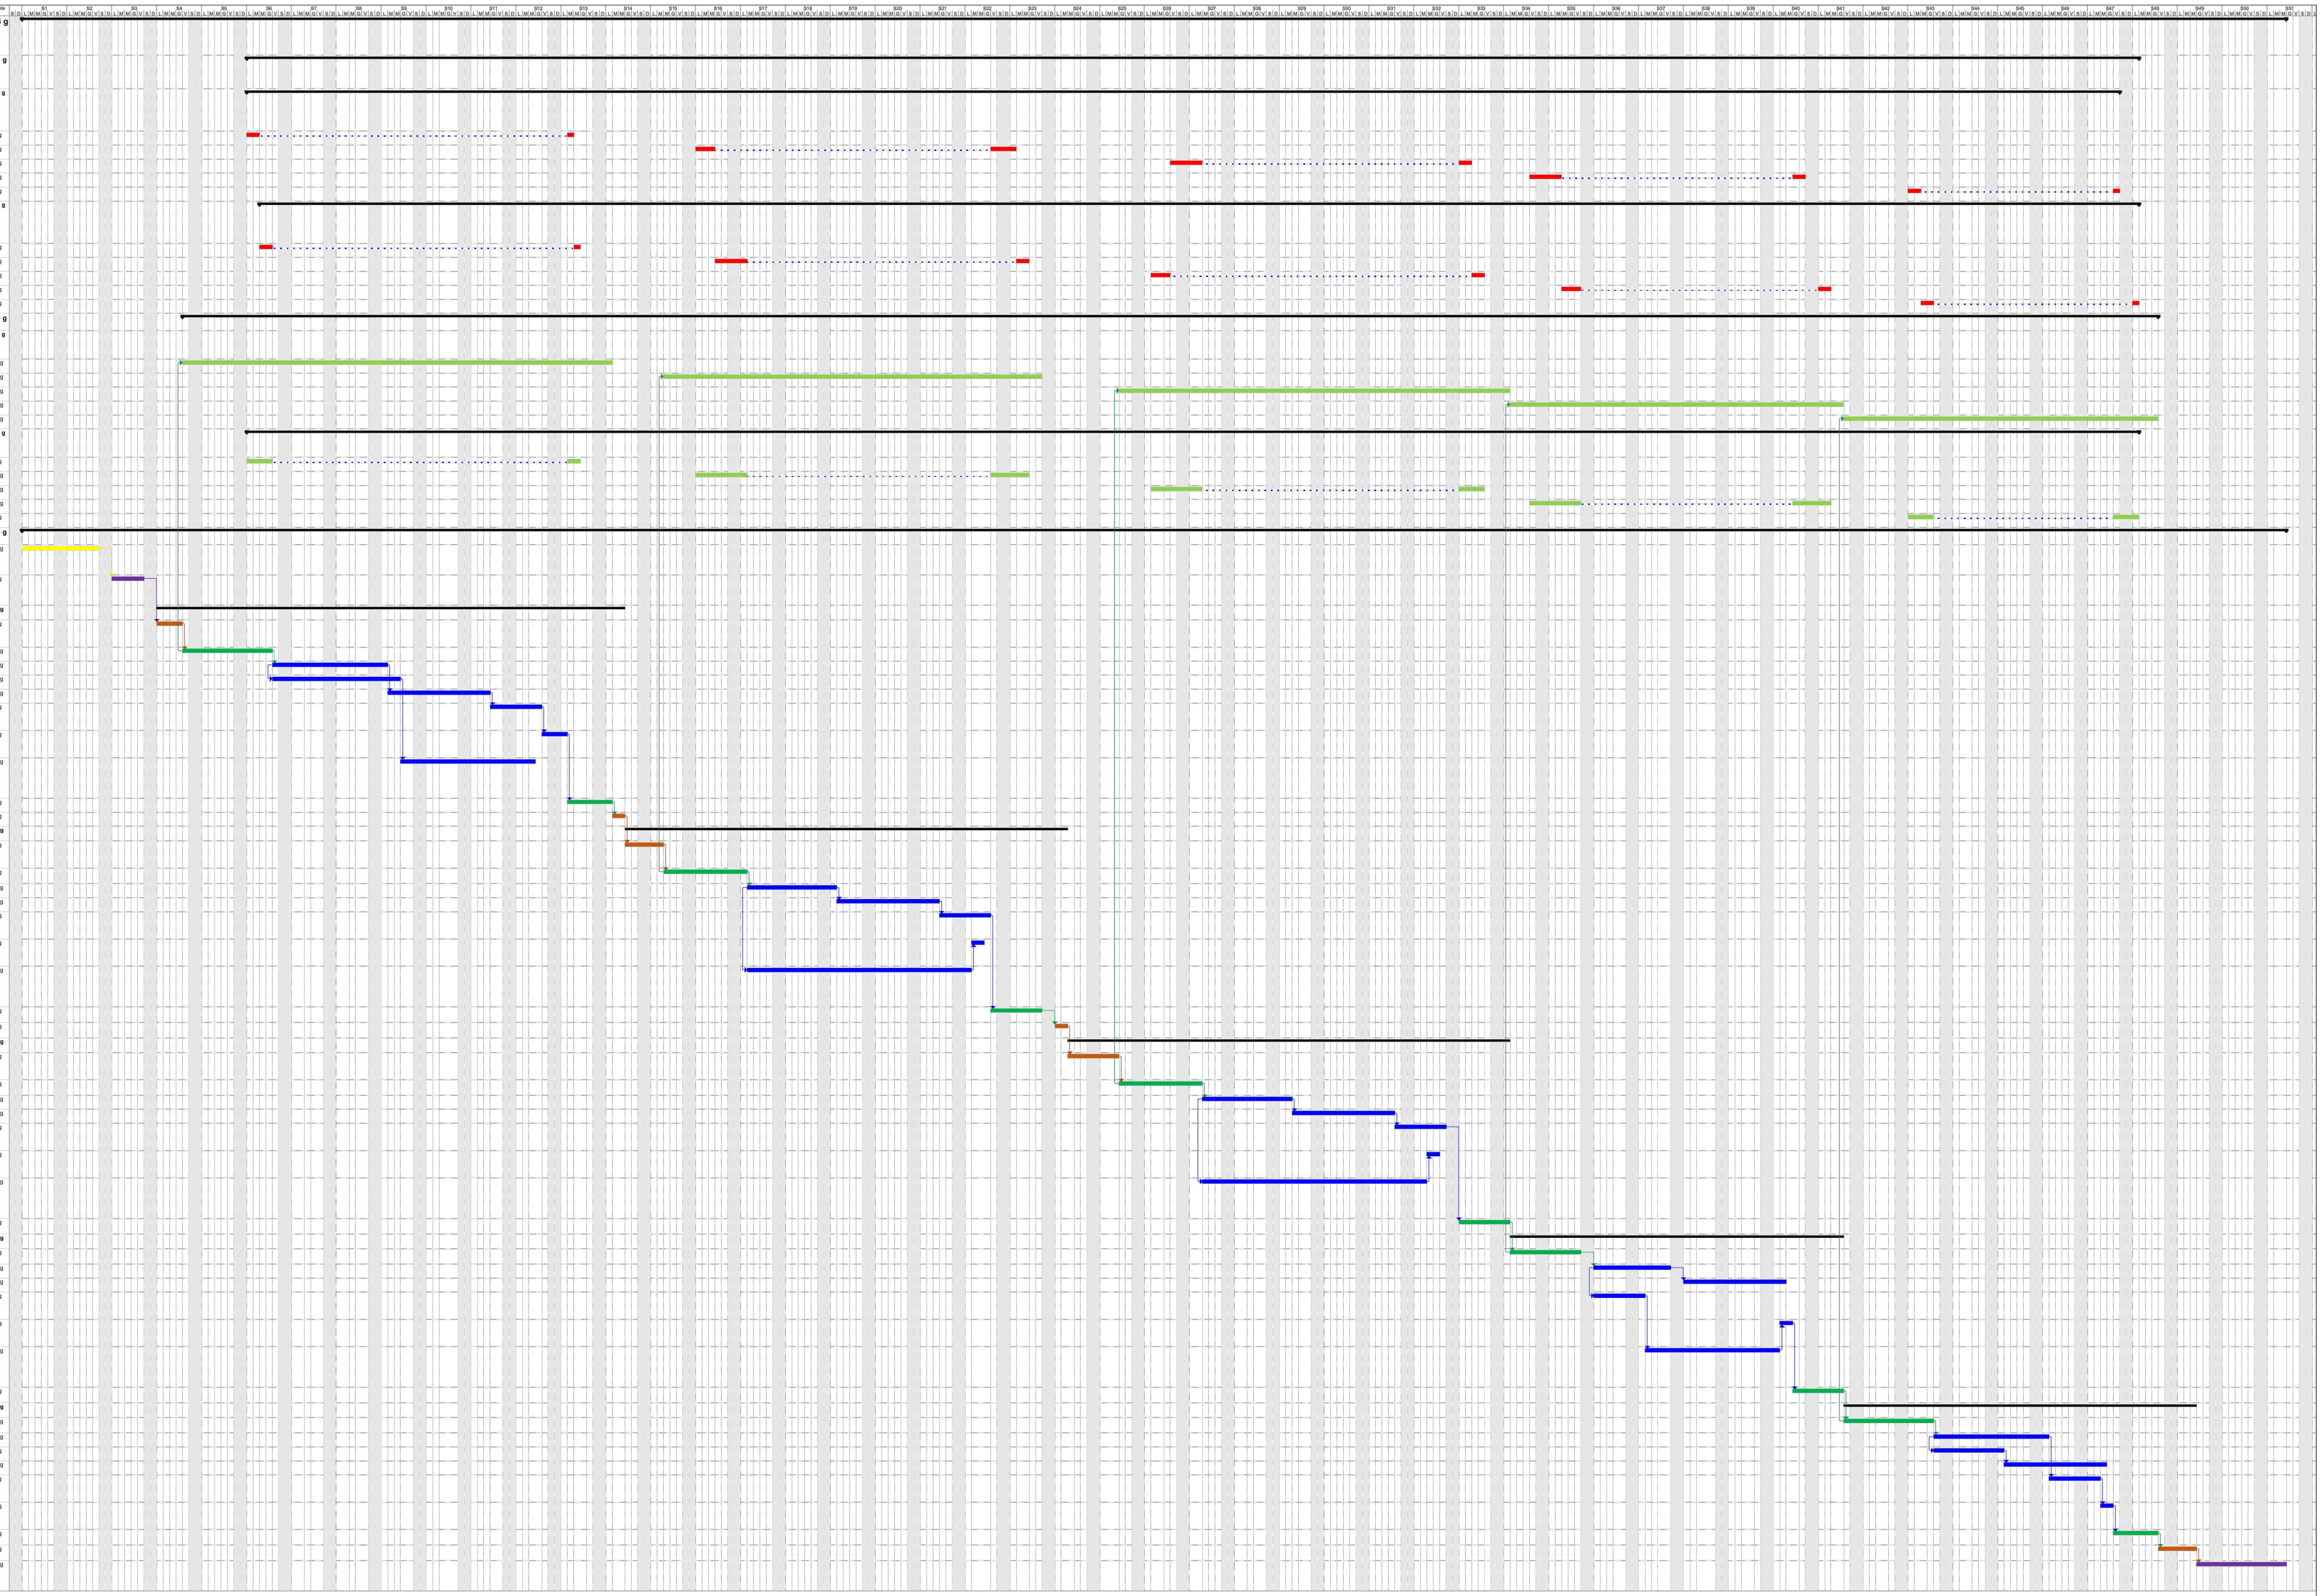

autostrade // per l'italia

AUTOSTRADA (A1) : MILANO–NAPOLI

TRATTO : VADO – FIRENZE NORD

INTERVENTI DI RIPRISTINO
DEL VIADOTTO CORZANELLO
OPERA 1816 – progr.km 269+088

PROGETTO ESECUTIVO

- Ripristini e protezione dei calcestruzzi
- Ripristino sistema di smaltimento acque meteoriche
- Realizzazione di nuova accessibilità a cavedi interni archi

PARTE GENERALE

CRONOPROGRAMMA

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Lanfranco Bernardini Ord. Ingg. Arezzo N. 541 RESPONSABILE UFFICIO PCM	Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746	Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746 RESPONSABILE DIVISIONE Esercizio e Nuove Attività

CODICE IDENTIFICATIVO

RIFERIMENTO PROGETTO			RIFERIMENTO DIRETTORIO	RIFERIMENTO ELABORATO				Ordinat.:
Codice Commessa	N.Prog.	Fase		Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	SCALA:
510177	298	PE	--------------	-	GEN	005	0	–

spea ENGINEERING gruppo Atlantia

PROJECT MANAGER:	SUPPORTO SPECIALISTICO	REVISIONE	
		n.	data
		0	NOVEMBRE 2018
		1	MARZO 2019
REDATTO:	VERIFICATO:		

VISTO DEL COMMITTENTE

autostrade // per l'italia

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.
